

Måløvhøj Vandværk skal have udskiftet rentvandsbeholderen og etableret automatisering af skylleprocessen.

Etablering af ny rentvandsbeholder

21/9 – Torsdag

Opstart på opgaven:

Udlægning af køreplader

Rømning af muld, og udgravning for beholder

– inkl. bortkørsel af overskudsjord

22/9 – Fredag

Skæring af beton

25/9 – Mandag

Skæring af beton fortsat

Etablering af gruspude for ny beholder

26/9 – Tirsdag

Etablering af gruspude for ny beholder, fortsat

27/9 – Onsdag

Levering af beholder fra omkring middag

28/9 – Torsdag

Diamantboring for rørgennemføringer

– tilgang + sug for rentvand og skyllevand

Rørføring og elmontage

29/9 – Fredag

Grusfyldning omkring beholder og rør

samt retablering af område

Desinficering af beholder – opstart vand til kloak.

1/10 – Mandag

Fjerne køreplader og færdiggør installation.

Automatisk skyl på filter

Udføres i uge 39 parallelt med etablering af beholder.

Der vil gå mindst 3-4 uger, før vi igen har Måløvhøj vand, da tanken lige skal lige køres ind, før vi kan få taget prøver.

Særligt til naboer til vandværket:

Vi glæder os til at få vores eget vand tilbage, efter at vi omkring 1. juni konstaterede indgroning af rødder i tanken og måtte overgå til nødforsyning.

Vi beder om forståelse for projektet og de gener, der følger med arbejdet.


Foreningens hjemmeside: www.maalovhoj.dk

HØJEN

106
September
2017

GRUNDEJERFORENINGEN "MÅLØVHØJ"

Orientering til Måløvhøj og naboer til vandværket

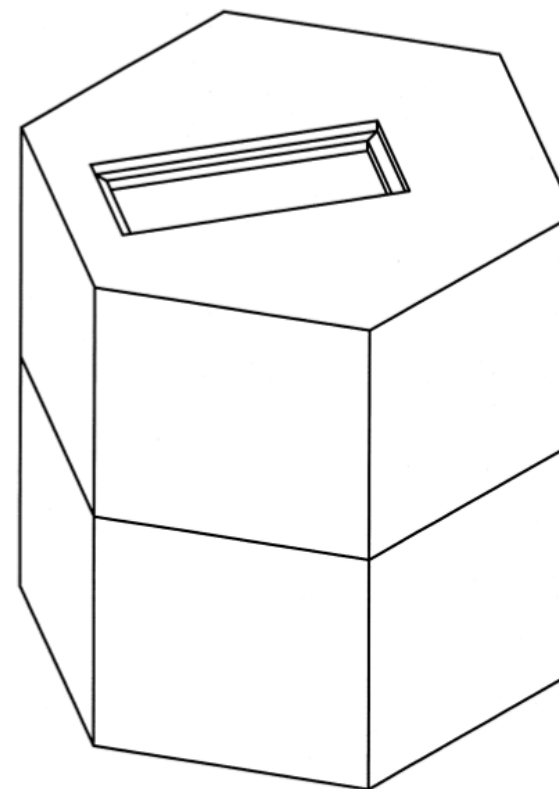

Tidsplan for

- Udskiftning af rentvandsbeholder
- Automatisering af skylleproces
