a.hak
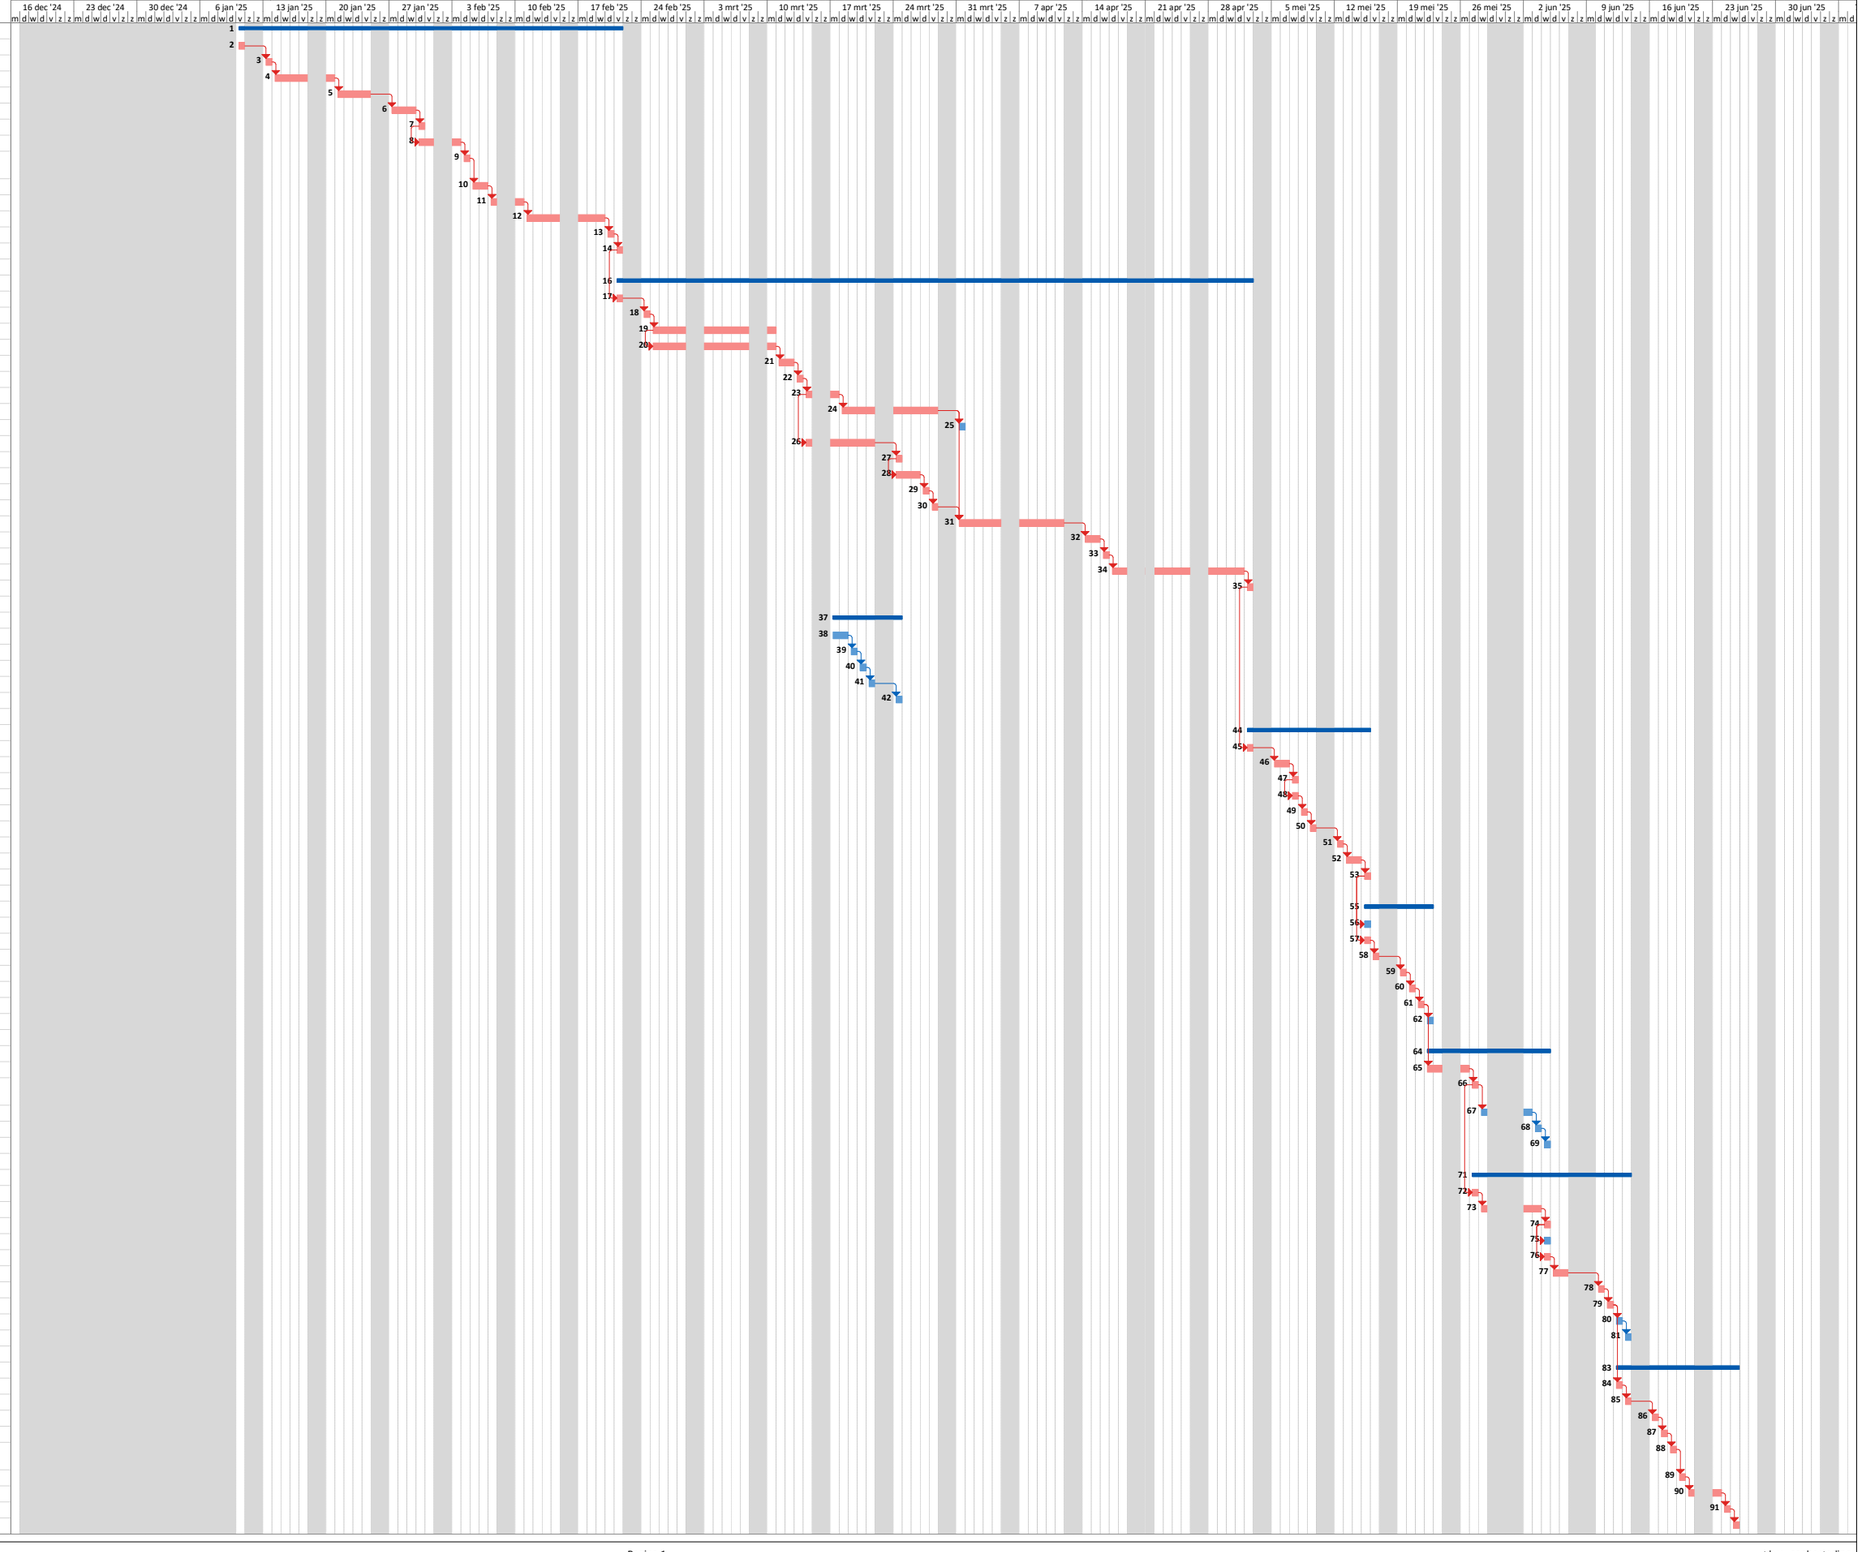
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**1 Kruising Heirweg / Bartolusstraat / Eise Eisingastraat**	**6,2 wkn**	**vri 10-1-25**	**vri 21-2-25**	
2	1.1 plaatsen verkeersplan 1332415-015-VP-7-1-1-0	1 dag	vri 10-1-25	vri 10-1-25	
3	1.2 bouwhekken plaatsen rondom de werkzaamheden	1 dag	maa 13-1-25	maa 13-1-25	2
4	1.3 graven cobi sleuf water en LD-gas + verwijderen oud riool	5 dagen	din 14-1-25	maa 20-1-25	3
5	1.4 graven solosleuf LD-Gas	4 dagen	din 21-1-25	vri 24-1-25	4
6	1.5 pe lassen Ø110pe LD-Gas leiding	3 dagen	maa 27-1-25	woe 29-1-25	5
7	1.6 sterkte en dichtheidstest LD-Gas	1 dag	don 30-1-25	don 30-1-25	6
8	1.7 graven sleuf water	3 dagen	don 30-1-25	maa 3-2-25	7GB
9	1.8 verwijderen oude waterleiding en leggen nieuwe waterleiding + inbouwen op 3 locaties	1 dag	din 4-2-25	din 4-2-25	8
10	1.9 inbouwen gasleiding op 4 locaties + overbruggingen	2 dagen	woe 5-2-25	don 6-2-25	9
11	1.10 verwijderen vervallen gas en waterleidingen	2 dagen	vri 7-2-25	maa 10-2-25	10
12	1.11 herstellen bestratingen	7 dagen	din 11-2-25	woe 19-2-25	11
13	1.12 verwijderen bouwhekken	1 dag	don 20-2-25	don 20-2-25	12
14	1.13 op laten halen verkeersplan 1332415-015-VP-7-1-1-0	1 dag	vri 21-2-25	vri 21-2-25	13
15					
16	**2 Eise eisingastraat**	**10 wkn**	**vri 21-2-25**	**vri 2-5-25**	
17	2.1 plaatsen verkeersplan 13324015-044-VP-1-1-2.0	1 dag	vri 21-2-25	vri 21-2-25	14GB
18	2.2 hekken plaatsen en deze meenemen met het werk	1 dag	maa 24-2-25	maa 24-2-25	17
19	2.3 graven sleuf water en LD-gas	10 dagen	din 25-2-25	maa 10-3-25	18
20	2.4 achter ons aan de sleuf weer dicht blokken	10 dagen	din 25-2-25	maa 10-3-25	19GB
21	2.5 sterkte en dichtheidstest LD-gas (zonder gestuurde boring)	2 dagen	din 11-3-25	woe 12-3-25	20
22	2.6 doorverbinden water en gas aan de kant van de Heirweg	1 dag	don 13-3-25	don 13-3-25	21
23	2.7 maken gestuurde boringen	2 dagen	vri 14-3-25	maa 17-3-25	22
24	2.8 saneren aansluitingen water	9 dagen	din 18-3-25	vri 28-3-25	23
25	2.9 maken nieuwe aansluiting LD-Gas Heirweg nr 56	1 dag	maa 31-3-25	maa 31-3-25	24
26	2.10 overzetten aansluitingen LD-Gas	6 dagen	vri 14-3-25	vri 21-3-25	23GB
27	2.11 plaatsen bermafzetting Heirweg 42 t/m 56	1 dag	maa 24-3-25	maa 24-3-25	26
28	2.12 overzetten aansluitingen LD-gas Heirweg 42 t/m/ 56	3 dagen	maa 24-3-25	woe 26-3-25	27GB
29	2.13 inzaaien en afwerken berm hairweg	1 dag	don 27-3-25	don 27-3-25	28
30	2.14 verwijderen verkeersmaatregelen heirweg 42 t/m 56	1 dag	vri 28-3-25	vri 28-3-25	29
31	2.15 verwijderen vervallen water en gas leidingen	10 dagen	maa 31-3-25	vri 11-4-25	30;24
32	2.16 Dammeren (vullen) vervallen water en gas leidingen in de tuinen	2 dagen	maa 14-4-25	din 15-4-25	31
33	2.17 verwijderen dammerpunten	1 dag	woe 16-4-25	woe 16-4-25	32
34	2.18 herstellen bestrating Eise Eisingastraat	10 dagen	don 17-4-25	don 1-5-25	33
35	2.19 opruimen verkeersmaatregelen 13324015-044-VP-1-1-2.0	1 dag	vri 2-5-25	vri 2-5-25	34
36					
37	**3 aansluitingen Molenweg (overbouwingen aanpassen)**	**1,2 wkn**	**maa 17-3-25**	**maa 24-3-25**	
38	3.1 aanpassen aansluiting Molenweg nr 7	2 dagen	maa 17-3-25	din 18-3-25	
39	3.2 aanpassen aansluiting Molenweg nr 6	1 dag	woe 19-3-25	woe 19-3-25	38
40	3.3 afwerken weiland	1 dag	don 20-3-25	don 20-3-25	39
41	3.4 dammeren vervallen gasleiding tussen Molenweg nr 6 en nr 7	1 dag	vri 21-3-25	vri 21-3-25	40
42	3.5 verwijderen dammerpunten	1 dag	maa 24-3-25	maa 24-3-25	41
43					
44	**4 Bartolusstraat nr 8 t/m 14**	**2 wkn**	**vri 2-5-25**	**don 15-5-25**	
45	4.1 plaatsen verkeersplan 13324015-044-VP-8-1-1.0	1 dag	vri 2-5-25	vri 2-5-25	35GB
46	4.2 aanleg nieuwe LD-gas leiding voor nr 8 en nr 10	2 dagen	maa 5-5-25	din 6-5-25	45
47	4.3 sterkte en dichtheidstest LD-gas	1 dag	woe 7-5-25	woe 7-5-25	46
48	4.4 doorverbinden LD-Gas aan 1 kant	1 dag	woe 7-5-25	woe 7-5-25	47GB
49	4.5 overzetten aansluitingen LD-Gas van nr 8, 10 en 14	1 dag	don 8-5-25	don 8-5-25	48
50	4.6 doorverbinden LD-Gas	1 dag	vri 9-5-25	vri 9-5-25	49
51	4.7 verwijderen vervallen gas leidigen	1 dag	maa 12-5-25	maa 12-5-25	50
52	4.8 herstellen bestratingen	2 dagen	din 13-5-25	woe 14-5-25	51
53	4.9 opruimen verkeersplan 13324015-044-VP-8-1-1.0	1 dag	don 15-5-25	don 15-5-25	52
54					
55	**5 aansluiting Stationsstraat nr 1**	**1,2 wkn**	**don 15-5-25**	**don 22-5-25**	
56	5.1 plaatsen verkeersplan 13324015-044-VP-6-1-1.0	1 dag	don 15-5-25	don 15-5-25	53GB
57	5.2 asfalt zagen t.b.v. nieuwe LD-gas aansluiting Stationsstraat nr 7	1 dag	don 15-5-25	don 15-5-25	53GB
58	5.3 aanleg nieuwe LD-Gas aansluiting door de Stationsstraat	1 dag	vri 16-5-25	vri 16-5-25	57
59	5.4 aanleg nieuwe LD-Gas aansluiting op het erf van Stationsstraat nr 7	1 dag	maa 19-5-25	maa 19-5-25	58
60	5.5 overzetten LD-Gas aansluiting stationsstraat nr 7	1 dag	din 20-5-25	din 20-5-25	59
61	5.6 afwerken trace en bestrating aanbrengen	1 dag	woe 21-5-25	woe 21-5-25	60
62	5.7 opruimen verkeersplan 13324015-044-VP-6-1-1.0	1 dag	don 22-5-25	don 22-5-25	61
63					
64	**6 aanpassen hoofdleiding LD-gas bij Stationsstraat nr 3**	**1,6 wkn**	**don 22-5-25**	**woe 4-6-25**	
65	6.1 aanpassen LD-Gas hoofdleiding bij Stationsstraat nr 3	3 dagen	don 22-5-25	maa 26-5-25	61
66	6.2 dammeren vervallen LD-gas leidingen door de tuinen Stationsstraat nr 1 nr 3 naar Bartolusstraat nr 8, 10, 12 en 14	1 dag	din 27-5-25	din 27-5-25	65
67	6.3 dammer (vulschuim) uit laten harden	2 dagen	woe 28-5-25	maa 2-6-25	66
68	6.4 dammerpunten verwijderen	1 dag	din 3-6-25	din 3-6-25	67
69	6.5 tuin afwerken Stationsstraat nr 3	1 dag	woe 4-6-25	woe 4-6-25	68
70					
71	**7 aanpassen waterleiding Balkstreek 2, 3, 5 en Heirweg 9**	**2,2 wkn?**	**din 27-5-25**	**vri 13-6-25**	
72	7.1 plaatsen verkeersmaatregelen balkstreek	1 dag	din 27-5-25	din 27-5-25	66GB
73	7.2 graven werkgaten balkstreek	3 dagen	woe 28-5-25	din 3-6-25	72
74	7.3 vervangen waterleiding Balkstreek	1 dag	woe 4-6-25	woe 4-6-25	73
75	7.4 tijdelijk overzetten aansluitingen 2, 3, 5	1 dag	woe 4-6-25	woe 4-6-25	74GB
76	7.5 tijdelijk overzetten aansluiting water heirweg 9	1 dag	woe 4-6-25	woe 4-6-25	74GB
77	7.6 saneren aansluitingen water Balkstreek 2, 3, 5 en heirweg 9	2 dagen	don 5-6-25	vri 6-6-25	76
78	7.7 werkgaten dichtmaken	0,2 wkn?	din 10-6-25	din 10-6-25	77
79	7.8 tuinen inzaaien en netjes maken	1 dag	woe 11-6-25	woe 11-6-25	78
80	7.9 bestrating herstellen	1 dag	don 12-6-25	don 12-6-25	79
81	7.10 verkeersmaatregen opruimen	1 dag	vri 13-6-25	vri 13-6-25	80
82					
83	**8 opruimen opslag locatie**	**2 wkn**	**don 12-6-25**	**woe 25-6-25**	
84	8.1 retourmaterialen afvoeren	1 dag	don 12-6-25	don 12-6-25	79
85	8.2 afval containers afvoeren	1 dag	vri 13-6-25	vri 13-6-25	84
86	8.3 schaftketen opruimen	1 dag	maa 16-6-25	maa 16-6-25	85
87	8.4 bouwaansluiting verwijderen	1 dag	din 17-6-25	din 17-6-25	86
88	8.5 laatste stukje Ø150ac verwijderen onder de rijplaten van de opslag locatie	1 dag	woe 18-6-25	woe 18-6-25	87
89	8.6 bouwhekken opruimen	1 dag	don 19-6-25	don 19-6-25	88
90	8.7 rijplaten opruimen	2 dagen	vri 20-6-25	maa 23-6-25	89
91	8.8 brug opruimen	1 dag	din 24-6-25	din 24-6-25	90
92	8.9 grasland frezen en inzaaien	1 dag	woe 25-6-25	woe 25-6-25	91
