Id	Opgavetils	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1		**Gård 1**	1 dag?	fr 04-11-22	fr 04-11-22	
2		Askelunden 2, S.TV	57 dage	sø 25-09-22	sø 11-12-22	
3		Askelunden 4, S.TV	65 dage	sø 25-09-22	to 22-12-22	
4		Askelunden 6, S:TV	80 dage	sø 25-09-22	to 12-01-23	
5		Askelunden 8 S.TH	153 dage	sø 06-11-22	ti 06-06-23	
6		Askelunden 8 S.TV	153 dage	sø 06-11-22	ti 06-06-23	
7		Askelunden 8 1,2 og 3 sal TV	140 dage	fr 18-11-22	to 01-06-23	
8		Askelunde 10 S.TV	162 dage	sø 06-11-22	ma 19-06-23	
9		Askelunden 10 S.TH	162 dage	sø 06-11-22	ma 19-06-23	
10		Askelunden 10 1,2 og 3 sal TV	140 dage	sø 20-11-22	to 01-06-23	
11		Askelunden 12 S.TH	172 dage	sø 06-11-22	ma 03-07-23	
12		Askelunden 12 1,2 og 3 sal TV	137 dage	on 23-11-22	to 01-06-23	
13		Askelunden 14 S:TH	157 dage	fr 18-11-22	ma 26-06-23	
14		Askelunden 14 S.TV	157 dage	fr 18-11-22	ma 26-06-23	
15		Askelunden 14 1, 2 og 3 sal TH	132 dage	on 30-11-22	to 01-06-23	
16		Askelunden 16 S.TH	121 dage	ti 24-01-23	ti 01-08-23	
17		Askelunden 16 1, 2, 3 TV	107 dage	ma 09-01-23	ti 06-06-23	
18		Birkelunden 1 S.TV	75 dage	ma 17-04-23	fr 18-08-23	
19		Brikelunden 3 S.TV	75 dage	ma 24-04-23	fr 25-08-23	18SS+5 dage
20		Birkelunden 5 S.TV	75 dage	ma 01-05-23	fr 01-09-23	19SS+5 dage
21		Birkelunden 7 S.TV	75 dage	on 03-05-23	ti 05-09-23	
22		Birkelunden 9 s.TV	75 dage	ma 08-05-23	fr 08-09-23	
23		Birkelunden 11 S.TV	75 dage	ma 08-05-23	fr 08-09-23	
24		Birkelunden 11, 1, 2, 3 MF	61 dage	on 31-05-23	on 13-09-23	
25		Birkelunden 13, STV, STH	61 dage	to 01-06-23	to 14-09-23	
26		Birkelunden 13 1, 2, 3 TV	61 dage	on 07-06-23	on 20-09-23	
27		Birkelunden 15, S.TV	61 dage	on 14-06-23	on 27-09-23	
28		Birkelunden 15 1, 2, 3 TH	61 dage	on 14-06-23	on 27-09-23	
29		**Gård 2**				
30		Birkelunden 2, 4, 6 Stueplan	75 dage	ma 31-07-23	fr 10-11-23	
31		Birkelunden 8, 10, 12 stueplan	80 dage	ma 07-08-23	fr 24-11-23	
32		Birkelunden 8, 1, 2, 3 TV	65 dage	on 23-08-23	ti 21-11-23	
33		Birkelunden 10 1, 2, 3 TV	65 dage	on 06-09-23	ti 05-12-23	
34		Bireklunden 10 1, 2, 3 MF	65 dage	on 06-09-23	ti 05-12-23	
35		Birkelunden 12, 1, 2, 3, TV	65 dage	on 13-09-23	ti 12-12-23	
36		Birkelunden 14, 16 stueplan	70 dage	fr 01-09-23	to 07-12-23	25AS-10 dage
37		Birkelunden 14, 1, 2, 3, TH	65 dage	on 20-09-23	ti 19-12-23	
38		Birkelunden 16, 1, 2, 3, TV	65 dage	on 27-09-23	to 04-01-24	
39		Cederlunden 1, 3, 5 stueplan	75 dage	ma 09-10-23	ti 30-01-24	30AS-25 dage
40		Cederlunden 7, 9, 11, stueplan	75 dage	ma 30-10-23	ti 20-02-24	39SS+15 dage
41		Cederlunden 11, 1, 2, 3 MF	65 dage	on 06-12-23	to 14-03-24	35AS-5 dage
42		Cederlunden 13, 15 Stueplan	70 dage	fr 01-12-23	ma 18-03-24	36AS-5 dage
43		Cederlunden 13 1, 2, 3, TV	65 dage	on 13-12-23	to 21-03-24	37AS-5 dage
44		Cederlunden 15 1, 2, 3, TH	65 dage	on 20-12-23	ti 02-04-24	38AS-5 dage
45		**Gård 3**				
46		Cederlunden 2, 4, 6, Stueplan	75 dage	on 24-01-24	ti 14-05-24	39AS-5 dage
47		Cederlunden 8, 10, 12 stueplan	80 dage	on 14-02-24	to 13-06-24	40AS-5 dage
48		Cederlunden 8, 1, 2, 3 TV	65 dage	on 21-02-24	on 29-05-24	
49		Cederlunden 10 1, 2, 3 TV	65 dage	on 28-02-24	to 06-06-24	
50		Cederlunden 10, 1, 2, 3 MF	65 dage	on 28-02-24	to 06-06-24	
51		Cederlunden 12, 1, 2, 3, TV	65 dage	fr 08-03-24	ma 17-06-24	41AS-5 dage
52		Cederlunden 14, 16 stueplan	70 dage	ti 12-03-24	on 26-06-24	42AS-5 dage
53		Cederlunden 14, 1, 2, 3, TH	65 dage	fr 15-03-24	ma 24-06-24	43AS-5 dage
54		Cederlunden 16, 1, 2, 3, TV	65 dage	fr 22-03-24	ma 01-07-24	44AS-5 dage
55		Daddellunden 1, 3, 5 stueplan	75 dage	ma 06-05-24	to 12-09-24	46AS-5 dage
56		Daddellunden 7, 9, 11, stueplan	75 dage	fr 07-06-24	to 10-10-24	47AS-5 dage
57		Daddellunden 11, 1, 2, 3, MF	65 dage	ti 11-06-24	ma 30-09-24	51AS-5 dage
58		Daddellunden 13, 15 Stueplan	70 dage	to 20-06-24	on 16-10-24	52AS-5 dage
59		Daddellunden 13 1, 2, 3, TV	65 dage	ti 18-06-24	ma 07-10-24	53AS-5 dage
60		Daddellunden 15 1, 2, 3, TH	65 dage	ti 25-06-24	ma 14-10-24	54AS-5 dage

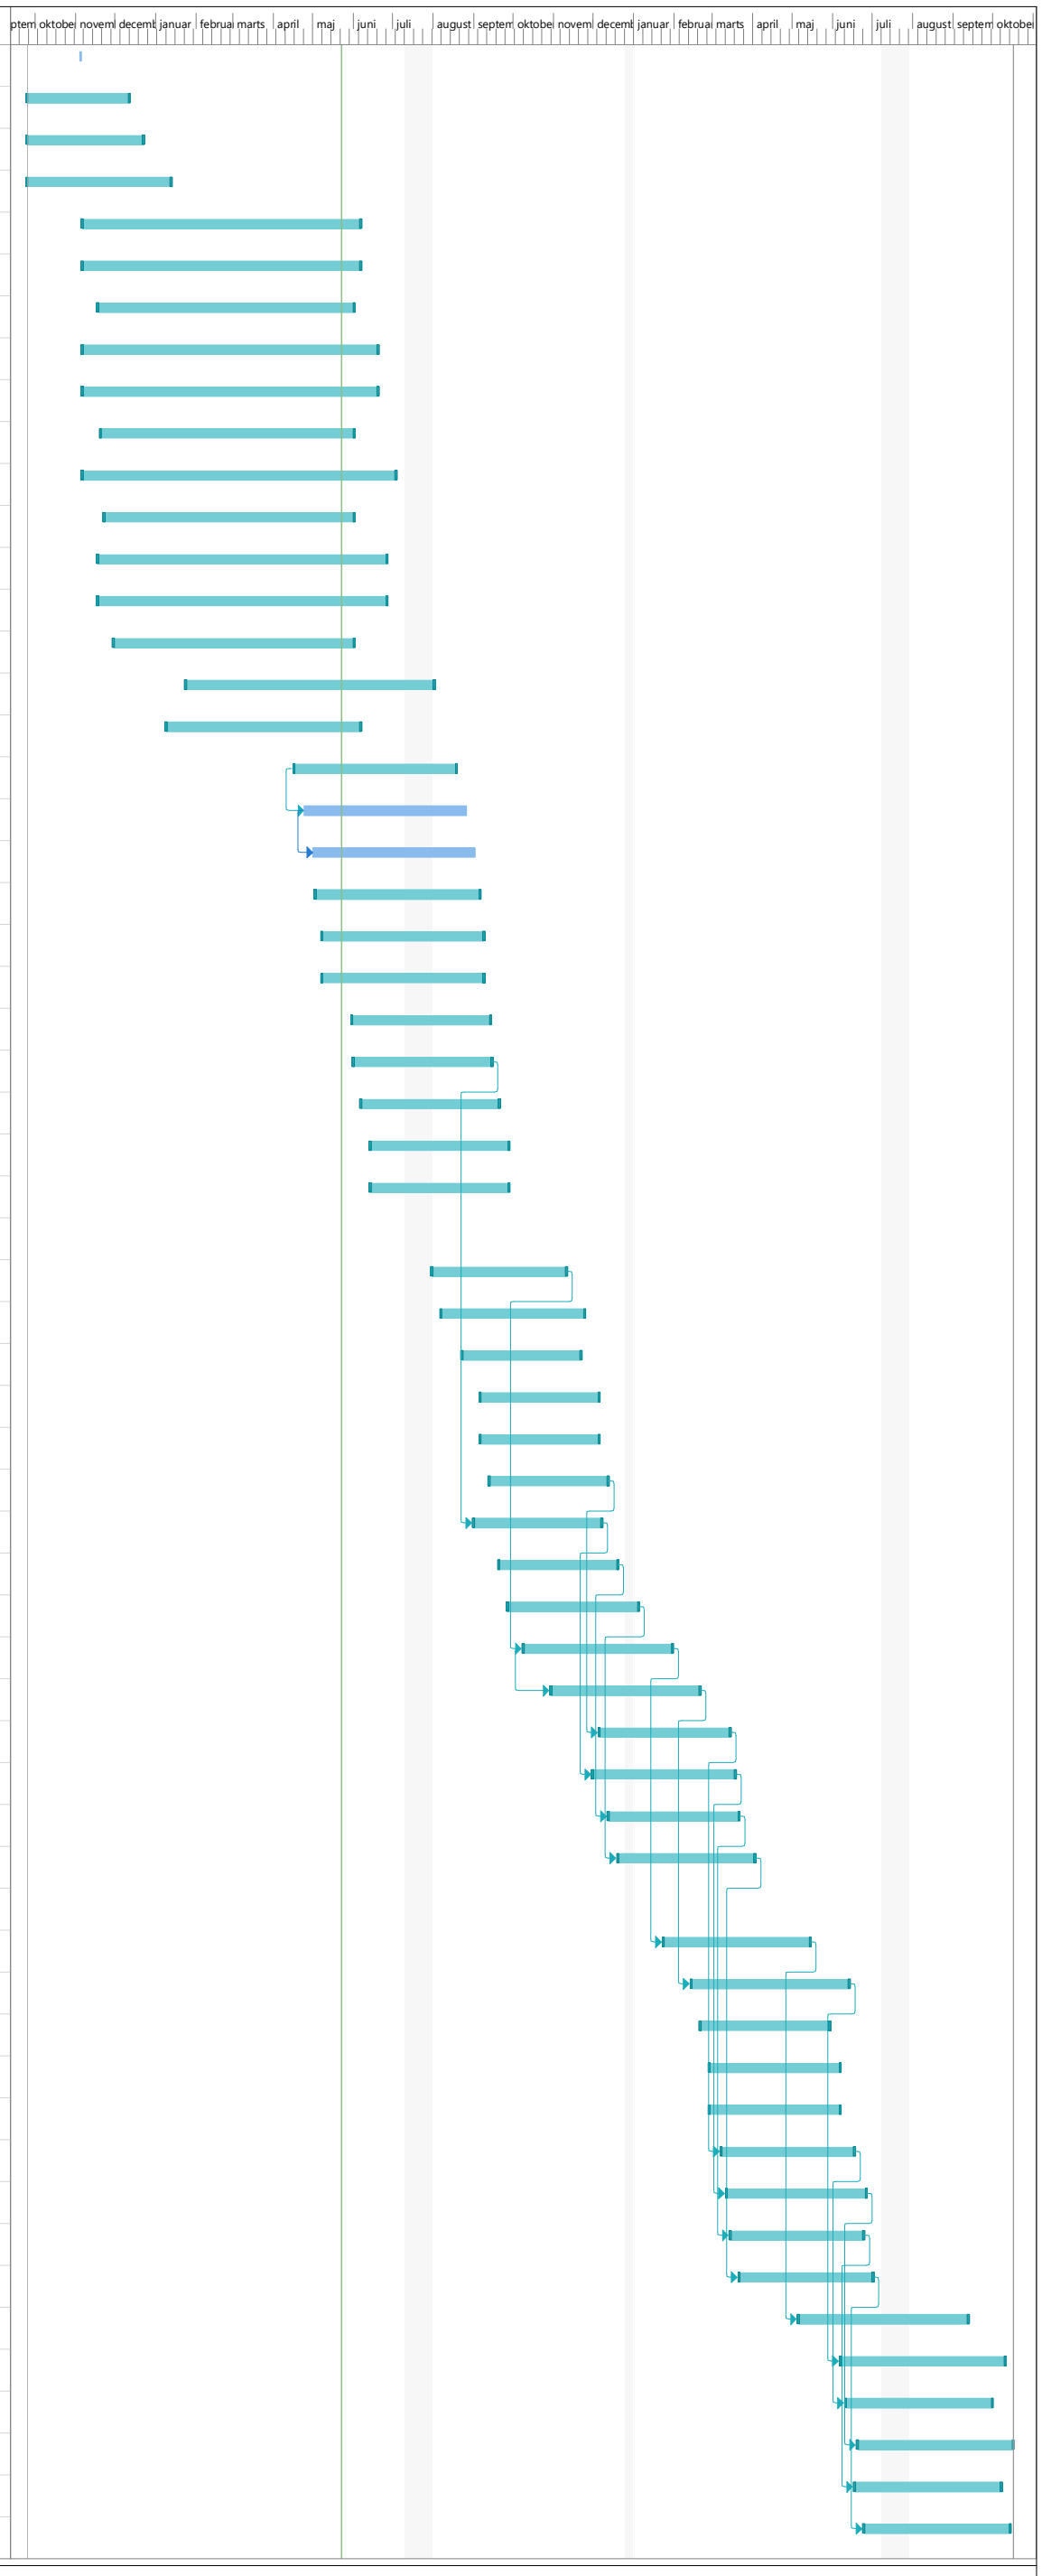

Projekt: Genhusningstidsplan,
Dato: ti 23-05-23

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			
