



C2C Coast to Coast Climate Challenge

Midtjyske erfaringer med LIFE IP

DNNK webinar 18. maj 2021

*Vicekontorchef og projektleder Dorthe Selmer
Region Midtjylland*



Hvad er særligt ved LIFE IP, når det gælder klimatilpasning?

Anbefalinger til ansøgningsprocessen

Anbefalinger til projektsetup og –drift

Komplementære projekter


Betydningen for policy udviklingen i EU

Potentielt udbytte for partnerne




Det særlige ved LIFE IP Climate

- På tværs med vilje – horisontalt og vertikalt
- Grænseoverskridende problemstillinger
- Løsninger skabes på tværs af grænser
- Mest brainwork. Masser af proces, ny viden, læring, udvikling og formidling
- Mulighed for lidt til anlæg
- Fokus på bæredygtighed og kapacitetsopbygning
- Planlægning løftes til et højere ambitionsniveau
- Faseopdeling med mulighed for justering for indhold

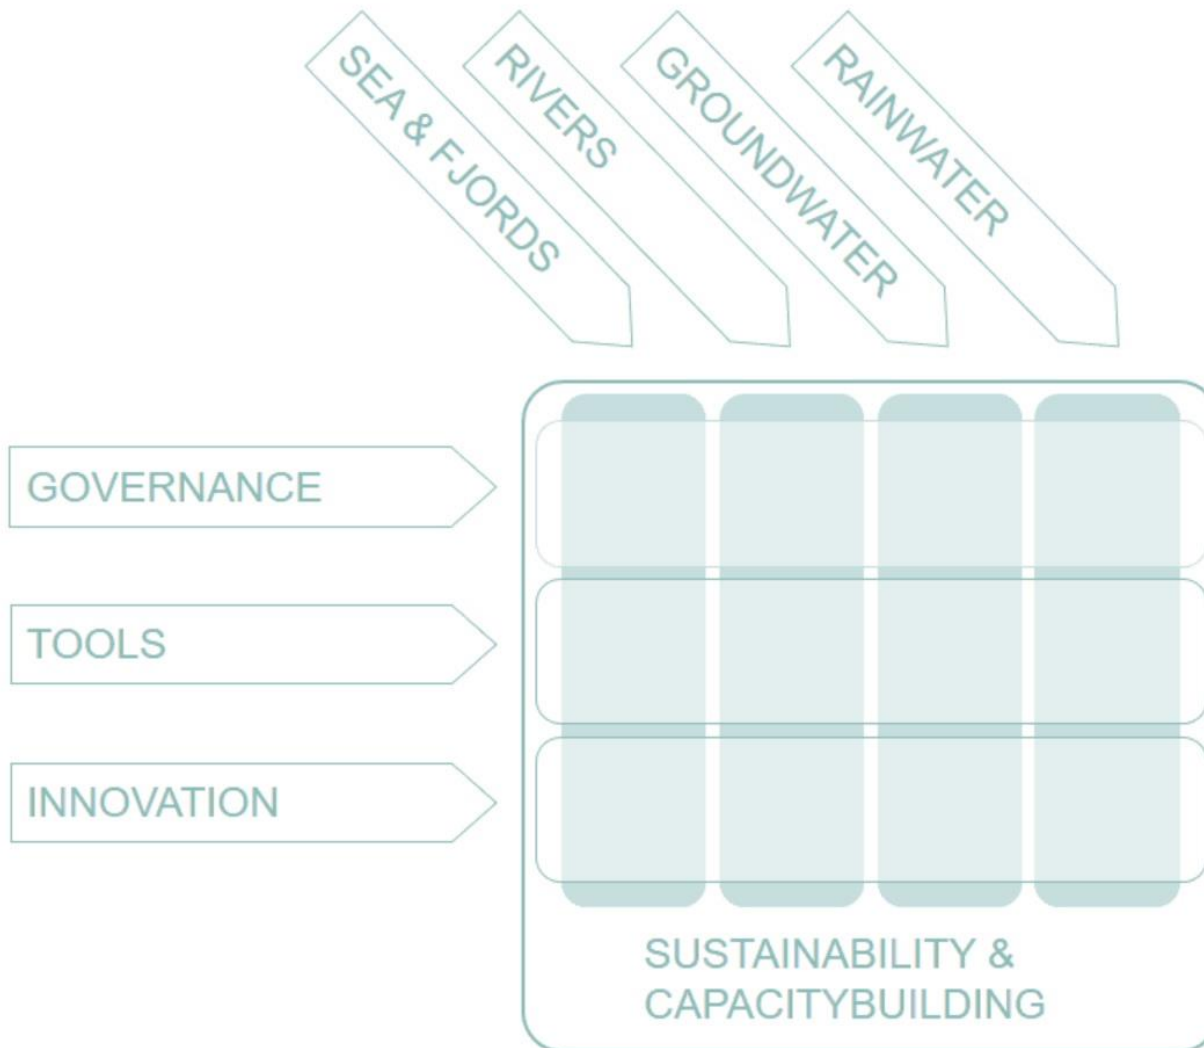

Hovedformål kort

- Klimarobust region
- Koordinere analyser og processer
- Opkvalificere myndigheder, borgere og virksomheder
- Fælles strategi

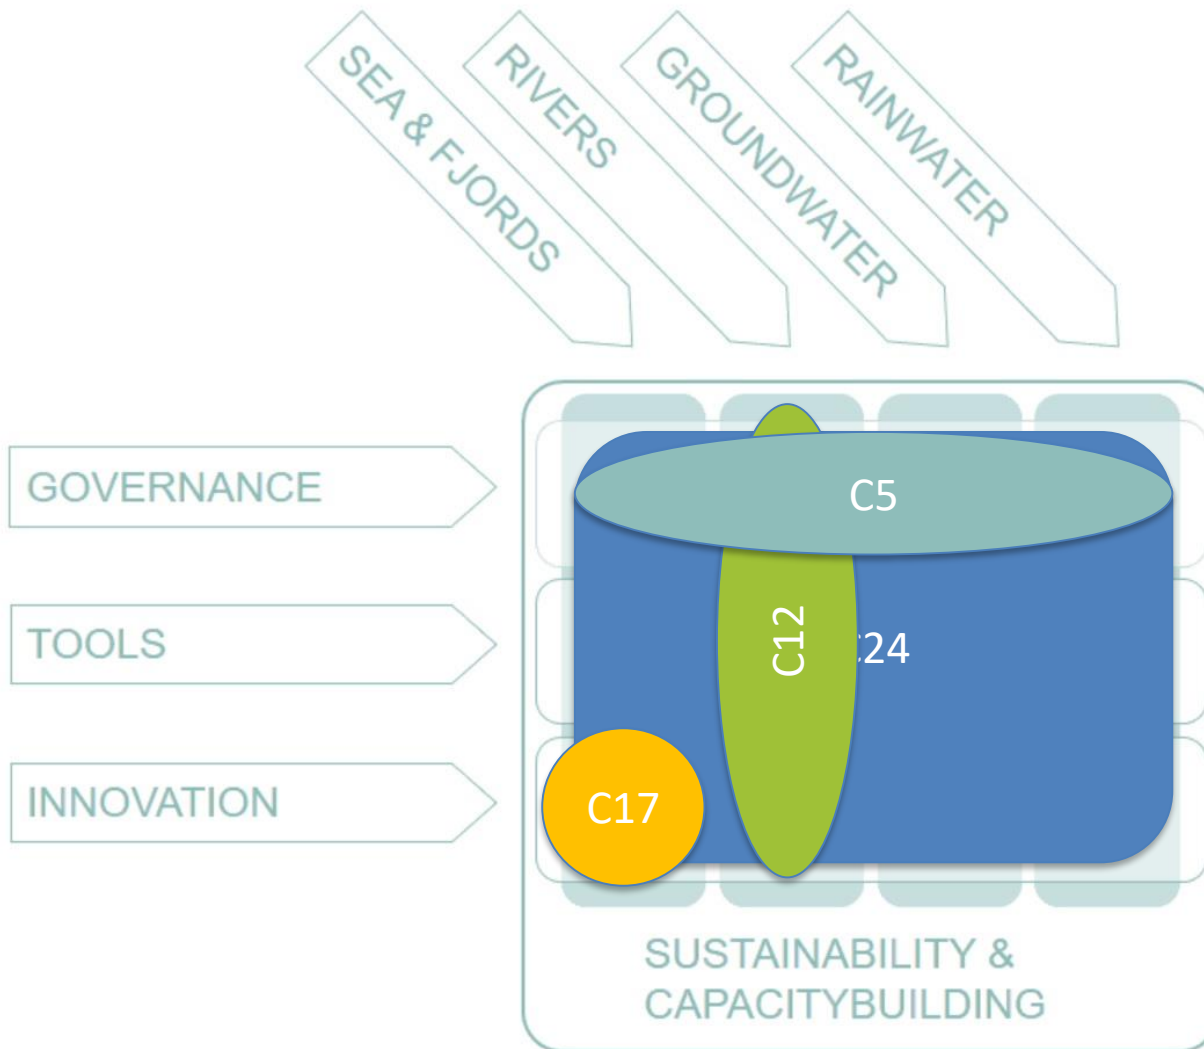

31 partnere (*kommuner, forsyninger, universiteter, regionen + CDEU*)
25 støttende aktører
24 delprojekter
 Budget **90** mio kr
 Støtte **52** mio kr
 Løbetid **6** år (2017 – 2022)

Det første IP Climate
 Stadig kun 2 IP Climate

Anbefalinger ansøgning

- Projektideen passer perfekt til callet
- Hav styr på LFA (*Logical Framework Approach*)
- Hav de nødvendige ressourcer og kompetencer til projektdesign og skrivning
- Hav en passende mængde relevante og interesserede partnere (*som du meget gerne må kende godt på forhånd*)
- Skab projektet sammen med partnerne
- Hav styr på finansieringen
- Ejerskab i partnernes organisationer

Anbefalinger projektsetup og –drift

Hav organiseringen klar inden start

Skab en bred styregruppe

Hav det administrative setup klar og sørg for at alle følger alle krav og retningslinjer hele tiden

Vær obs på dokumentation

Vær obs på deliverables og milestones

Brug monitorerne konstruktivt

Fasthold partnernes tilknytning til det samlede projekt og ikke kun deres eget delprojekt

Lad dig ikke slå ud af:

Ny skabelon kort inden afrapportering

Meget korte tidsfrister og lange svartider

Ukoordineret monitorering og kontrol

Komplementære projekter

Ideer, planer og viden fra dit projekt, skal gerne bringes i anvendelse / udføres i praksis

Relevante indspil fra andre projekter skal gerne i spil hos dig

Vigtigt for After LIFE aktiviteter

Policy udvikling i EU

Lyttende tilgang

- allerede da callen blev skrevet
- i planlægning af program for næste programperiode

Vi oplever meget stor interesse for projektet

- fremlæggelser for Kommissionen
- deltagelse i events
- henvisning af andre (*Indien, Bretagne, Ungarn, Letland ...*)

Mere IP fremover

Partnerernes udbytte

- Ny viden, nye kompetencer og nye metoder
- Anvendeligt netværk. Masser af sparring og inspiration, Har lært mine egne kolleger bedre at kende
- Mulighed for at arbejde i større sammenhænge / meget mere helhedsorienteret. Bredere ejerskab
- Kunne aldrig selv have skabt et sådant projekt / det brede samarbejde
- Enormt givende studieture til udlandet
- Tendens til fokus på det lokale og at man glemmer det store projekt
- Tendens til at undervurdere, hvor meget tid man skal bruge i fællesskabet
- Overraskende hvor meget fokus der er på korrekt dokumentation nye metoder
- Udfordrende at chefer og politikere har tendens til ikke at anerkende projektet

Vi er ved at undersøge, hvad projektet så faktisk har gjort for de oprindelige klimatilpasningsplaner

Foreløbig kan vi sige:

- bedre klimatilpasning sammen end hver for sig
- mere helhedsorienterede løsninger
- bedre samspil med interessenter
- bedre forståelse hos borgere, når der koordineres på tværs af kommunegrænser
- politikerne tør nu også tale klimatilpasning og ikke kun forebyggelse af klimaforandringer
- lettere at tilvejebringe finansiering, når der har været gjort det gode forarbejde i projektet



Studietur til Holland maj 2018
50 deltagere

Tak for opmærksomheden

Dorthe Selmer
projektleder på C2C CC

tlf **3053 9544**

mail dorsel@rm.dk

Læs mere www.c2ccc.eu
